

**Název stavby:**

## **III/15273 Ostopovice – Moravany II.**

**Stav před rekonstrukcí:**

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu komunikace mezi obcemi Ostopovice a Moravany bylo navrženo zesílení stávajícího povrchu v tl.50mm a lokální sanace konstrukčních vrstev u propadlých okrajů vozovky. Začátek úseku se nachází v intravilánu obce Ostopovice v křižovatce se silnicí III/15270 v km 0,000. Konec úseku se nachází v intravilánu obce Moravany v křižovatce se silnicí III/15275 v km 2,050.

**Nový stav:**

Intravilán Ostopovice - Začátek úseku se nachází v křižovatce se silnicí III/15270 a končí u cedule konec obce Ostopovice. V tomto úseku došlo k odfrézování stávajícího povrchu a úpravě nevyhovujícího příčného sklonu. Zároveň došlo k pročištění stávajícího příkopu, který je zaústěn do stávající horské vpusti. Ta byla v rámci stavby vyčištěna. Součástí stavby bylo zbudování rigolu z příkopových tvárnic u paty přiléhajícího svahu.

Extravilán - Úsek se nachází mezi obcemi Ostopovice - Moravany. V tomto úseku došlo nejprve k lokální sanaci propadlých okrajů vozovky (včetně podkladních vrstev) a k lokální sanaci krytu vozovky (pouze asfaltové vrstvy). Poté došlo k vyrovnávce a následnému zesílení vozovky v tl.50mm.

Intravilán Moravany - Začátek úseku se nachází u cedule začátek obce Moravany a končí v křižovatce se silnicí III/15270 V tomto úseku došlo k odfrézování stávající obrusné vrstvy, vyrovnávce povrchu a k pokládce nové obrusné vrstvy. Výškové a šířkové uspořádání vozovky bylo zachováno.

**Projektant:** SÚS JMK p.o.k.


**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
IČO: 41601645

**Termín realizace:** 08/2017 - 11/2017

**Náklady stavby:** 5 926 tis. Kč

**Zdroj financování:** NIV. SÚS JMK, OPRAVY SILNIC  
MOSTŮ

Mapa

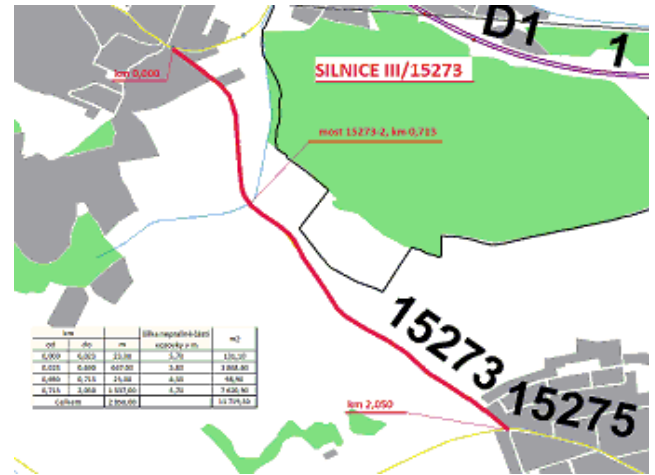

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

