

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

MIKROKOBERENCE 2025

III/37357 Pavlov – Benešov – Suchý

Stav před opravou:

Povrch silnice III/37357 (dříve silnice II/373) v extravilánových úsecích Pavlov-Benešov a Benešov-Suchý byl narušen korozí a vykazoval ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch byl rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění výsrávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace většího rozsahu ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. Lokálně poškozená místa byla sanována.

Nový stav:

SO 101 Pavlov – Benešov

SO 102 Benešov - Suchý

Byla provedena souvislá oprava povrchu silnice v úseku km 6,457 – 7,290 a v km 8,728 – 11,401 provozního staničení silnice III/37357 v extravilánu mezi osadou Pavlov a začátkem zástavby obce Benešov a koncem zástavby obce Benešov a obcí Suchý. Byly provedeny lokální sanace porušených míst (výtluky, plošný rozpad, pokles vozovky) - frézování obrusné vrstvy na tl. 50 mm, provedení spojovacího postřiku a pokládka ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm. Znatelné mrazové trhliny byly sanovány proříznutím a zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou. Po zametení vozovky a aplikaci spojovacího postřiku byl položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 + 0/8.

Po dokončení pokládky mikrokoberce bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou (a následně plastem) - vodící proužky V4 š. 0,125 m.

SO 101 Pavlov – Benešov

Staničení km 6,457 – 7,290

Délka úseku: 0,833 km

Plocha: 4.498 m²

SO 102 Benešov - Suchý

Staničení km 8,728 – 11,401

Délka úseku: 2,673 km

Plocha: 15.136 m²

Projektant: SÚS JMK


Zhotovitel: SAT s.r.o.

Termín realizace: 09/2025 – 10/2025

Náklady stavby: 8 343 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC

Mapa

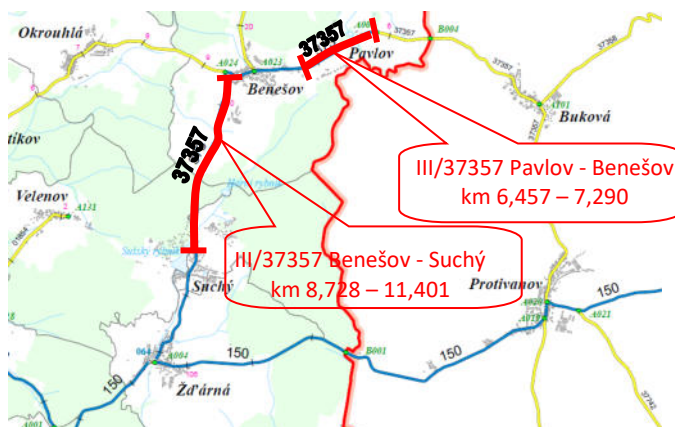

Stav před opravou



Stav po opravě

