

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**Mikrokoberce 2025
II/409 Vratěnín – hranice JČ kraje**


Stav před opravou:

Vozovka v předmětném úseku vykazovala ztrátu pojiva a částečně kameniva z povrchu vozovky, sníženou drsnost a trhliny v povrchu.

Nový stav:

Jedná se o provedení souvislé údržby silnice II/409 km 97,338 – 100,590 v úseku od hranic Jihočeského kraje po začátek obce Vratěnín. Na tomto úseku byly na ploše 16 585 m² provedeny lokální sanace - frézování v tl. 50 mm, spojovací postřík, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm. Trhliny byly ošetřeny zálivkou. Po očištění vozovky a aplikaci spojovacího postříku byl položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberce. Závěrem bylo provedeno VDZ.

Mapa

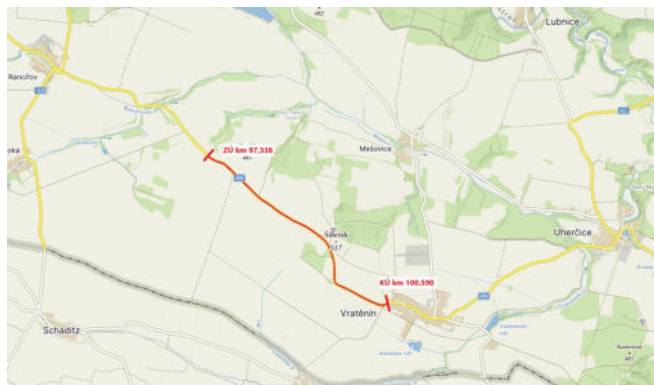

Stav před opravou



Stav po opravě



Zhotovitel:	SILKO s.r.o.
Termín realizace:	08/2025
Náklady stavby:	7 410 tis. Kč vč. DPH
Zdroj financování:	OPRAVY SILNIC
