

Název stavby:

III/0462 Drysice – Vyškov, SO 101

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné a podélné trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice III/0462 v extravilánu mezi obcemi Vyškov a Drysice a intravilánu obce Drysice. V rámci rekonstrukce bylo provedeno vyfrézování stávajících krytových vrstev, lokální sanace, opravy trhlin, položení nových krytových vrstev a zřízení krajnice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,327 km.

Projektant: IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
IČO: 27689328


Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.,
IČO: 45274924

Termín realizace: 10/2017 - 11/2017

Náklady stavby: 15 399 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, NIV. SÚS JMK

Mapa

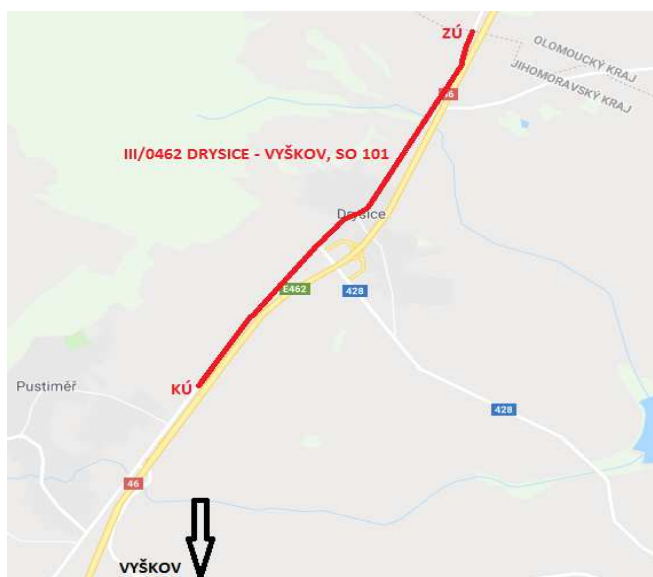

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

