

*Název stavby:*

## **MIKROKOBERCE 2018 III/37926 Drnovice - Luleč**

*Stav před rekonstrukcí:*

Povrch silnice vykazoval nevyhovující protismykové vlastnosti. A zároveň se zde objevovali mrazové trhliny a lokální nerovnosti a poruchy povrchu. Celková délka údržby byla 2,055 km.

*Nový stav:*

Na úseku III/37926 mezi obcemi Drnovice a Luleč byla provedena souvislá údržba položením dvouvrstvého emulzního mikrokoberce. V rámci přípravných prací bylo provedeno odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení, byly provedeny lokální vysprávkky porušeného povrchu (frézování tl. 50 mm, vyplnění asfaltovým betonem ACO v tl. 50 mm do úrovně okolního povrchu), tenké mrazové trhliny byly opraveny profrézováním a zalitím asfaltovou zálivkou. Na očištěný povrch byl položen mikrokoberce dvouvrstvý z modifikované emulze a kameniva frakce 4/8. Po dokončení pokládky bylo provedeno zametení volného kameniva a bylo realizováno vodorovné dopravní značení.

**Projektant:** SÚS JMK, p.o.k.


**Zhotovitel:** BITUNOVA spol. s r.o.

**Termín realizace:** 8/2018 - 9/2018

**Náklady stavby:** 3 356 tis. Kč

**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

*Mapa*

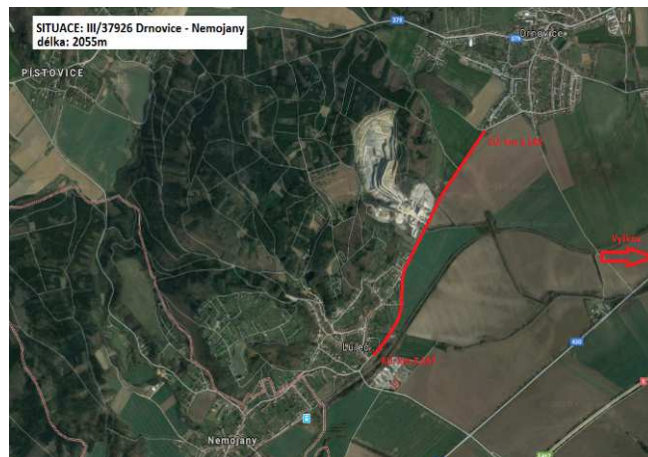

*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

