

Název stavby:

II/398 Vranovská Ves – Šumná

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl špatný dopravně technický a stavební stav úseku silnice spojující obce Vranovská Ves a Šumná. Mezi nejzávažnější závady patřily trhliny, deformace povrchu a nevyhovující tloušťka asfaltových vrstev, nedostatečné odvodnění mělkými příkopy.

Nový stav:

Předmětem je provedení rekonstrukce silnice II/398 v délce 1000 m, vč. sjezdů a dalších souvisejících prací v extravilánovém úseku mezi obcemi Vranovská Ves – Šumná, v provozním staničení km 38,430 – 39,430.

Směrové řešení trasy rekonstruovaného úseku zůstalo zachováno, výškové řešení zde bylo lokálně navýšeno dle diagnostiky vozovky a potřeby vyrovnání podélných nerovností. Mimo rekonstrukci vozovky zde byla provedena obnova krytu veškerých sjezdů, prohloubení silničních příkopů, obnova veškerých směrových sloupků, provedení středové a vodící čáry z plastické hmoty.

Nové šířkové uspořádání komunikace - S7,0/50.

Konstrukce vozovky:

ACO 11+ tl. 50 mm, PS-E 0,3 kg/m², ACL 16+ tl. 70 mm, PS-E 0,4 kg/m², frézování hl. 40 až 70 mm (celková tloušťka úpravy 60 – 160 mm).

Projektant: Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.
IČO: 274 66 868


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

Termín realizace: 06/2019 - 10/2019

Náklady stavby: 7 009 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019

Mapa

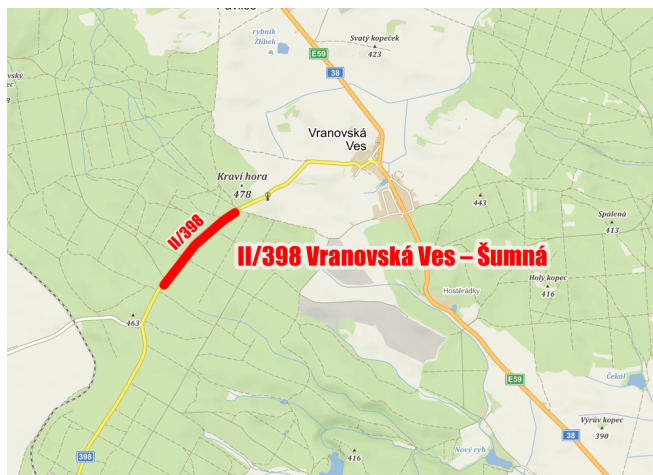

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

