

Název stavby:

Mikrokoberce 2019 - II/373 Ostrov – Vilémovice

Stav před rekonstrukcí:

Povrch silnice II/373 v extravilánovém úseku od konce městyse Ostrov (od parkoviště u jeskyně Balcarka) po začátek zástavby obce Vilémovice byl narušen korozi a vykazoval ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch byl rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace většího rozsahu ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. Lokálně poškozená místa budou sanována v nezbytně nutném rozsahu.

Nový stav:

Opravený úsek se nachází v km 47,486 – 49,421 provozního staničení silnice II/373. Na tomto úseku bylo v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. 20 mm na požadované parametry dle ČSN 736130. Lokální oprava porušených míst (výtluky, plošný rozpad, pokles vozovky) spočívala ve vyfrézování obrusné vrstvy na tl. 50 mm, provedení spojovacího postřiku a pokládky asfaltového betonu ACO 11 50/70 v tl. 50 mm. Celkový rozsah takto provedených sanací činil 217,50 m². Po aplikaci spojovacího postřiku byl položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberce frakce kameniva 0/8 a s použitím kationaktivní asfaltové emulze BIT-60 KSM.


Po dokončení pokládky mikrokoberce bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodící čáry V4 š. 12,5 cm.

Silnice II/373 Ostrov - Vilémovice

Staničení km 47,486 – 49,421
Délka úseku: 1,935 km

Projektant: SÚS JMK
Zhotovitel: BITUNOVA spol. s r.o.
Termín realizace: 06/2019 – 07/2019
Náklady stavby: 2 875 tis. Kč
Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ 2019

Mapa

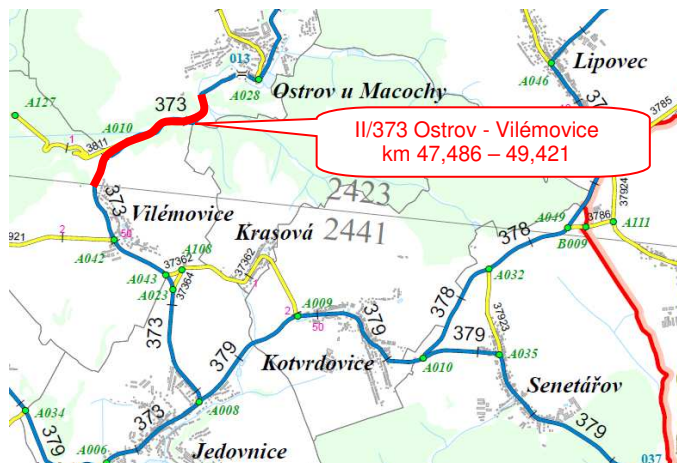

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

