

Název stavby:

III/37440 Vavřinec - Sloup

Stav před rekonstrukcí:

Stávající povrch silnice III/37440 v penetrační úpravě vykazoval vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch byl nehomogenní z hlediska komfortu jízdy i protismykových vlastností, příčný profil vozovky byl silně deformovaný.


Nový stav:

Byla provedena souvislá oprava povrchu v km 10,150-11,150 v extravilánovém úseku mezi obcí Vavřinec ve směru k městyso Sloup. Před křižovatkou se silnicí II/377 oprava navázala na opravu povrchu provedenou v uplynulých letech. Celková délka úpravy je 1,000 km.

Oprava byla realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě vizuální prohlídky bylo provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky – celoplošné vyrovnání stávajícího povrchu z asfaltového betonu ACL16 v průměrné tl. 40 mm a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm. V místě napojení na původní povrch na konci zástavby obce Vavřinec bylo provedeno lokální frézování podél obrubníků v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice z R-materiálu a ošetření pracovních spár modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Délka úseku 1,000 km.

Mapa

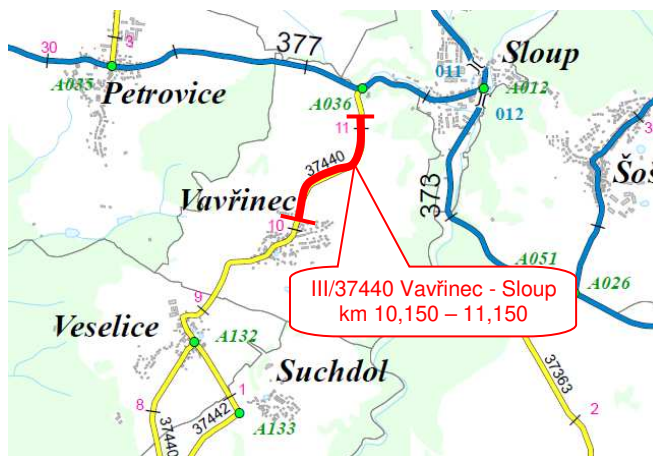

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 10/2021 – 11/2021

Náklady stavby: 3 108 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021
