


Název stavby:

**III/37442 Nové Dvory – Suchdol -
Veselice**

Mapa

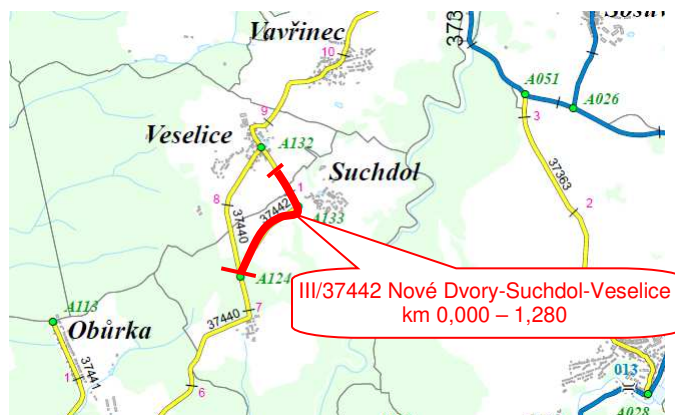

Stav před rekonstrukcí:

Stávající povrch silnice III/37442 v penetrační úpravě vykazoval vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek četné nerovnosti, povrch byl nehomogenní z hlediska komfortu jízdy i protismykových vlastností, příčný profil vozovky byl silně deformovaný. V lesním úseku od silnice III/37440 po Suchdol byl stav silnice havarijní, opakované lokální vysprávkování již byly neúčinné a neekonomické.

Nový stav:

Byla provedena souvislá oprava povrchu v km 0,000-1,280 v extravilánovém úseku mezi křižovatkou se silnicí III/37440 a začátkem zástavby místní části Veselice. V prostoru autobusových zastávek Suchdol bylo provedeno lokální frézování stávajícího povrchu kolem stávajících obrubníků. Celková délka úpravy je 1,280 km.

Oprava byla realizována ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě vizuální prohlídky bylo provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky – celoplošné vyrovnaní stávajícího povrchu z asfaltového betonu ACL16 v průměrné tl. 40 mm a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 40 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice z R-materiálu a ošetření pracovních spár modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Délka úseku 1,280 km.

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: SÚS JMK

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 10/2021 – 11/2021

Náklady stavby: 3 186 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC 2021.
