

Název stavby:

III/3744 Kořenec - Benešov

Stav před rekonstrukcí:

Extravilánový úsek silnice III/3744 Kořenec – Benešov v km 19,413 – 20,128 vykazoval nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, povrch byl po zimním období narušen výtluky v obrusné vrstvě.

Nový stav:

Před prováděním stavebních prací bylo provedeno odstranění nánosů na krajnicích, očištění říms na stávajícím propustku a odstranění zbytků nefunkčního zábradlí. Beton čel propustku byl sanován, bylo provedeno zvýšení říms do úrovně budoucí nivelety vozovky. Na vozovce byl proveden spojovací postřík a vyrovnání stávajícího povrchu v prům. tl. 20 mm. Nová obrusná vrstva byla položena z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice a osazení svodidla v místě stávajícího propustku v km 19,484. Tyto práce zajistila SÚS Jmk ve vlastním režii.

Silnice III/3744 Kořenec - Benešov

Staničení km 19,413 – 20,128

Délka úseku: 0,715 km


Projektant: SÚS JMK, oblast Blansko

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

Termín realizace: 08/2012

Náklady stavby: 1 163 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

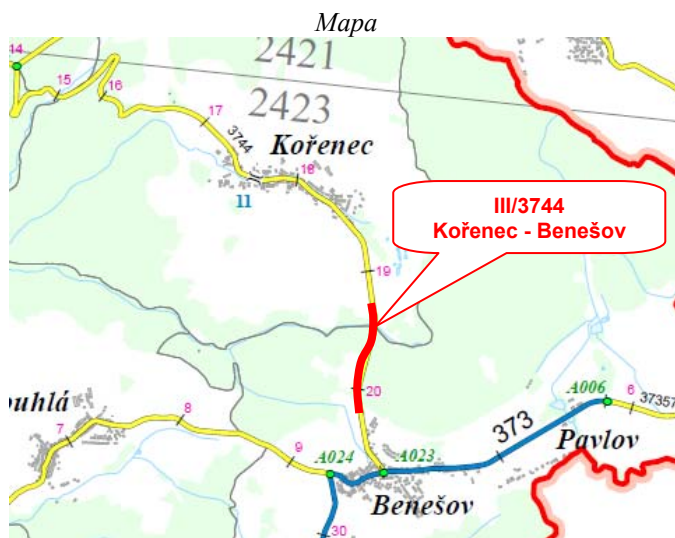

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

