

Název stavby:

III/37359 Okrouhlá

Stav před rekonstrukcí:

Úsek silnice III/37359 byl po skončení zimního období ve špatném stavebně technickém stavu. Povrch byl narušen četnými výtluky a vykazoval nerovnosti vlivem provádění četných vysprávek v různých časových obdobích. Vizuální prohlídkou nebyly shledány konstrukční poruchy, které by signalizovaly neúnosné podloží.

Nový stav:

Stavba je rozdělena na dva úseky – průtah obcí Okrouhlá v km 6,419 – 7,644 a extravilánový úsek Okrouhlá – Benešov v km 7,644 – 9,250, celková délka stavby je 2,831 km. Před provedením vlastní opravy byly odstraněny stávající zvýšené krajnice a bylo provedeno celoplošné očištění povrchu vozovky samosběrem. Na stávajícím povrchu vozovky bylo provedeno lokální frézování v proměnné tl. 0 – 50 mm (frézování napojení na začátku a konci úpravy, v místě napojení místních komunikací). Po vyspravení výtluků a vyrovnání příčného profilu a provedení spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva ze směsi ACO 11+ (asfaltový beton střednězrný) v tloušťce 50 mm. Na závěr bylo provedeno ošetření středové pracovní spáry modifikovanou zálivkou a dosypání nezpevněné krajnice. Obec Okrouhlá provedla kompletní rekonstrukci chodníků v celém průtahu.

Silnice III/37359 Okrouhlá průtah

Staničení km 6,419 – 7,644

Délka úseku: 1,225 km

Šířkové uspořádání proměnné, odpovídající stávajícím šířkovým poměrům .

Silnice III/37410

Staničení km 7,644 – 9,250

Délka úseku: 1,606 km

Šířkové uspořádání proměnné, odpovídající stávajícím šířkovým poměrům .

Celková délka úseku 2,831 km

Projektant: -


Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

Termín realizace: 08/2011

Náklady stavby: 6.921 tis. Kč

Zdroj financování: ŠKODY PO ZIMĚ Z JMK

Mapa

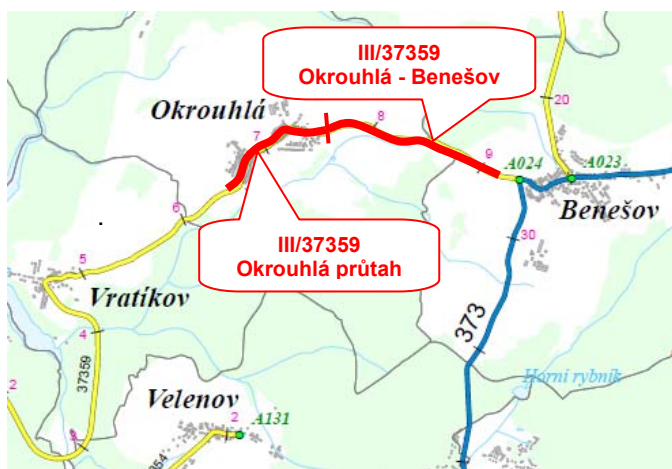

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

