

**Název stavby:**

**II/400 Újezd – Dobronice, 1.etapa**

**Původní stav:**

Stavební a dopravně technický stav upravovaného úseku stávající komunikace II/400 byl celkově špatný a neodpovídal převáděnému dopravnímu zatížení. Povrch komunikace vykazoval četné plošné deformace, výtluky a trhliny.

**Nový stav:**

Předmětem stavby bylo provedení úpravy silnice II/400 v úseku od obce Újezd až po křižovatku silnice II/400 s II/399 ve staničení km 17,575 – 19,853 v celkové délce 2278 m. Úprava zahrnovala provedení vyrovnání nerovností (výtluky atd.), provedení vrstvy penetračního makadamu hrubého, aplikaci 2x asfaltového nátěru 8/11. Po aplikaci nátěrů se naněs spojovací postřík a obrusná vrstva bez podélné pracovní spáry. Provedlo se dosypání krajnic (v návaznosti na dosypání krajnic došlo k vyčištění příkopů). V rámci stavby byly upraveny i příslušné vjezdy, sjezdy a napojení silnice III/4006.

**Konstrukce úpravy:**

- penetrační makadam hrubý PMH tl. 90 mm
- 2x asfaltový nátěr 8/11 tl. 10 mm
- spojovací postřík 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- obrus. vrstva ACO 11+, PMB 25/55-60 tl. 50 mm

**Projektová dokumentace:**

Ing. Leoš Kučeřík  
Božice 441, 671 64  
IČ:74523503


**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
IČO: 26177005

**Termín realizace:** 10/2013 až 12/2013

**Náklady stavby:** 7 917 898 Kč včetně DPH

**Zdroj financování:** JMK 7 917 898 Kč

Mapa

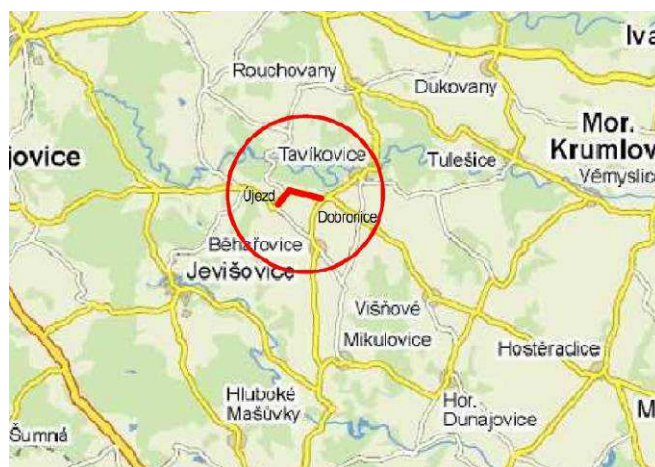

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

