

Název stavby:

III/37446 Křtiny - Habrůvka

Stav před rekonstrukcí:

Extravilánový úsek silnice III/37446 mezi městysem Křtiny a obcí Habrůvka v km 0,000 – 1,450 (od vyústění silnice III/37446 ze silnice III/37445 po začátek zástavby obce Habrůvka) vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, povrch je narušen výtluky v obrusné vrstvě. Je navrženo provedení celoplošné opravy stávajícího asfaltového krytu.

Nový stav:

Před prováděním prací na vozovce bylo provedeno odstranění nánosů na krajnicích, očištění stávajícího povrchu a očištění prostoru kolem říms mostu 37446 – 1. Na vozovce byl proveden spojovací postřik a vyrovnání stávajícího povrchu v prům. tl. 20 mm. Nová obrusná vrstva byla položena z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11 v tl. 50 mm. V místech napojení na stávající místní komunikace a napojení na silnici III/37445 bylo provedeno lokální frézování. Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bylo provedeno dosypání nezpevněné krajnice se zhutněním.

Silnice III/37446 Křtiny - Habrůvka

Staničení km 0,000 – 1,450

Délka úseku: 1,450 km

Projektant: SÚS JMK, oblast Blansko

Zhotovitel: Skanska a.s.


Termín realizace: 11/2013

Náklady stavby: 3.157 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI 2013

ISPROFIN: 5621120002

Mapa

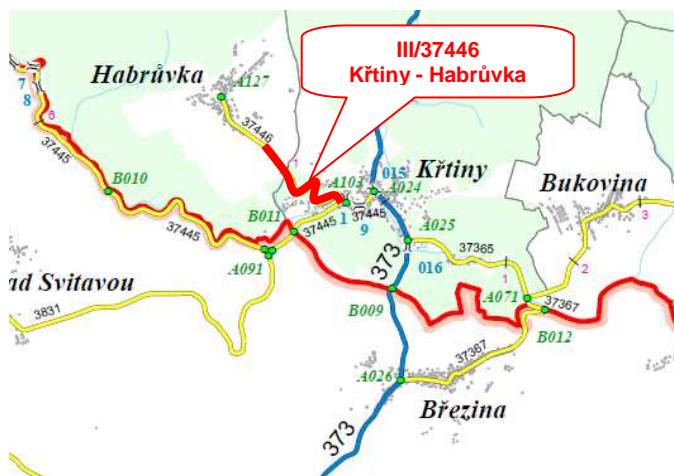

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

