

Název stavby:

II/400 Hostim - Rozkoš

Původní stav:

Předmětný úsek stávající silnice II/400 svým stavem neodpovídal převáděným dopravním zátěžím. Dopravně technický a stavební stav byl celkově špatný a samotný povrch komunikace vykazoval četné plošné deformace a trhliny.

Nový stav:

Jedná se o provedení úpravy silnice II/400 v úseku mezi obcemi Hostim a obcí Rozkoš ve staničení km 5,850 – 6,450 v celkové délce 600 m. Úprava zahrnovala provedení vyrovnání nerovností (propadených krajů vozovky, výtluky atd.), provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu, zřízení zemních krajnic (v rámci zřízení zemních krajnic došlo k vyčištění příkopů). Pokládka obrusné vrstvy byla provedena bez podélné pracovní spáry. V rámci stavby byly upraveny i příslušné vjezdy, sjezdy.

Konstrukce úpravy:

- spojovací postřik 0,5 kg/m²;
- vyrovnání nerovností z ACO 11+;
- spojovací postřik 0,5 kg/m²;
- obrusná vrstva z ACO 11+, tl.60 mm.


Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 26177005

Termín realizace: 11/2013


Náklady stavby: 3 233 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SÚS JMK 2 643 974 Kč
SFDI 589 098 Kč

ISPROFIN: 5621120002

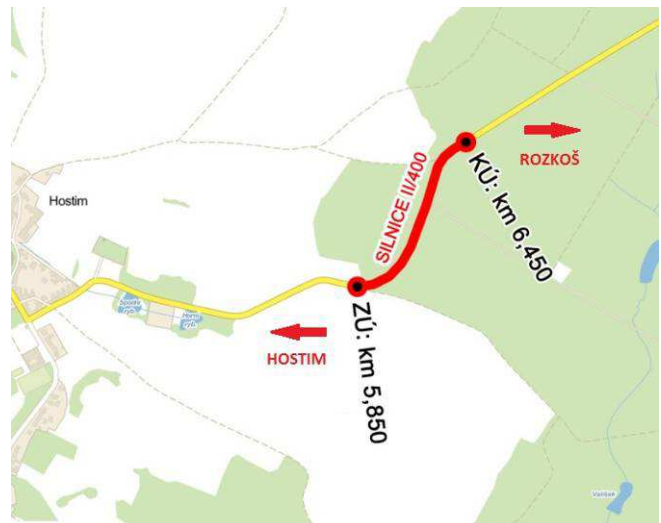

Stav před opravou

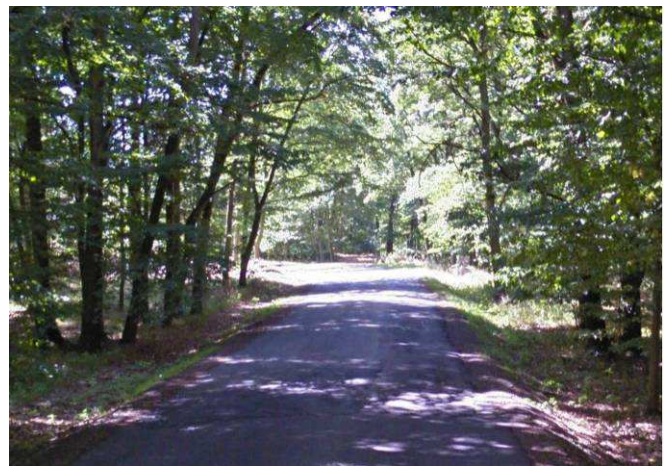

Stav po opravě

