

Název stavby:
III/15275
Brno - Moravany

Původní stav:

Povrch vozovky v uvedeném úseku vykazoval množství poruch, zejména opotřebení obrusné vrstvy, výtluky, deformace povrchu, příčné i mozaikové trhliny, vyjeté koleje. V uvedeném úseku je silnice enormně zatěžována nákladní i kamionovou dopravou k podnikům sídlícím v Moravanech.

Nový stav:

Jednalo se o provedení opravy krytové vrstvy silnice III/15275 v úseku mezi městem Brno a obcí Moravany ve staničení km 1,171–2,336 s vynecháním úseku v km 2,020–2,185 v celkové délce 1 000 m. Oprava zahrnovala odfrézování tl. 5cm, provedení sanace výtluků a trhlin, položení obrusné vrstvy z asfaltového betonu a upravení armatur a ul. vpusti ve vozovce.


Konstrukce opravy:

- plošné vyrovnání nerovností z ACI 16;
- spojovací postřik 0,7 kg/m²;
- obrusná vrstva z ACO 11, tl.60 mm.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno,
spol. s r.o.
IČ: 41601645

Termín realizace: 11/2013
Náklady stavby: 3 363 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI
ISPROFIN: 5621120002

Mapa

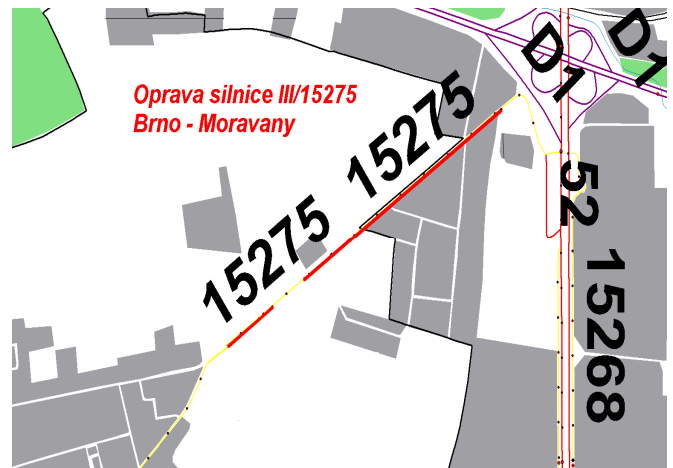

Stav před opravou



Stav po opravě

