

Název stavby:

III/37414 Sudický Dvůr - Sudice

Stav před rekonstrukcí:

Úsek silnice III/37414 Sudický Dvůr - Sudice v km 1,318 – 2,018 vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, povrch je narušen výtluky v obrusné vrstvě. Před vlastní opravou bylo provedeno očištění stávajícího povrchu a odstranění nánosů na krajnicích. Objednatel provedl rovněž opravu čela propustku v km 1,435.

Nový stav:

Bylo navrženo provedení celoplošné opravy povrchu zesílením stávajících konstrukčních vrstev. Bylo provedeno vyrovnaní stávajícího povrchu asfaltovým betonem v prům. tl 20 mm a po aplikaci spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 50 mm.

Po dokončení stavebních prací provedla SÚS JMK dosypání nezpevněné krajnice a úpravu napojení polních cest a sjezdů.

Silnice III/37414 Sudický Dvůr - Sudice

Staničení km 1,318 – 2,018

Délka úseku: 0,700 km

Projektant: SÚS JMK, oblast Blansko

Zhotovitel: PORR a.s.


Termín realizace: 11/2013

Náklady stavby: 2.009 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI

ISPROFIN: 5621120002

Mapa

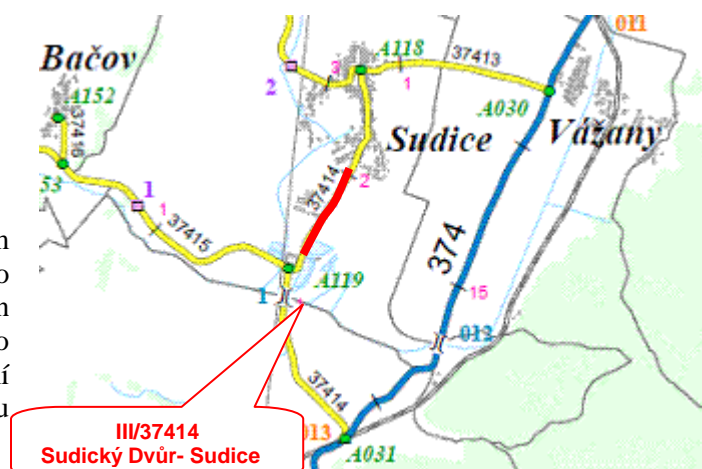

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

