

Název stavby:

III/15268

Brno – Vídeňská, obslužná

Původní stav:

Silnice v tomto úseku je enormně zatěžována nákladní a kamionovou dopravou k podnikům sídlícím podél této komunikace. Povrch vozovky vykazoval množství poruch, zejména opotřebení obrusné vrstvy, výtluky, deformace povrchu, příčné i mozaikové trhliny a vyjeté koleje.

Nový stav:

Jednalo se o provedení opravy krytové vrstvy silnice III/15268 v intravilánu města Brna ve staničení km 3,010 – 3,760 v celkové délce 750 m. Oprava zahrnovala odfrézování obrusné vrstvy a provedení vyrovnání nerovností (výtluků, trhlin atd.), provedení obrusné vrstvy z asfaltového betonu a upravení armatury a ul. vpusti ve vozovce. Po opravě povrchu bylo obnoveno VDZ.

Konstrukce opravy:

- plošné vyrovnání nerovností z ACI 16;
- spojovací postřík 0,7 kg/m²;
- obrusná vrstva z ACO 11 (ABS), tl.60 mm.

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

IČ: 42196868


Termín realizace: 11/2013

Náklady stavby: 2 777 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI

ISPROFIN: 5621120002

Mapa

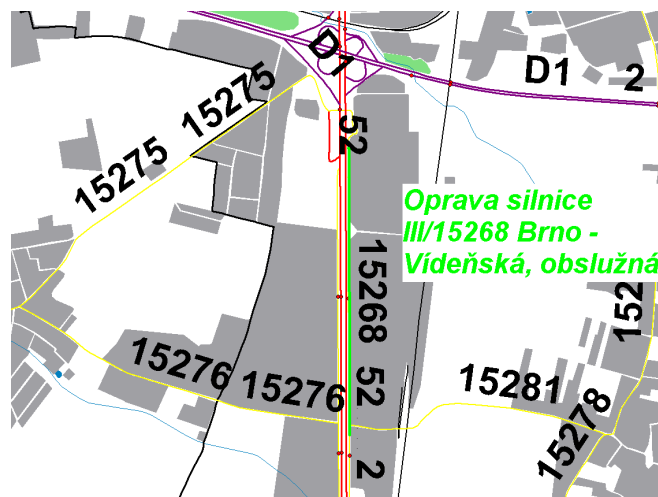

Stav před opravou



Stav po opravě

