

Název stavby:

II/152 Jamolice - hranice kraje Vysočina

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace – četné deformace vozovky, příčné trhliny, výtluky.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/152 v extravilánovém úseku od konce obce Jamolice po hranice Jihomoravského kraje v pasportním staničení km 91,469 – 93,254 (délka 1 785 m).

V rámci rekonstrukce silnice byla na většině úseku provedena recyklace stávající vozovky (ložná vrstva) a následné zesílení 3 novými asfaltovými vrstvami (ACP22+ 60 mm, ACL22+ 60 mm, SMA11+ 50 mm). Šířkové uspořádání úpravy silnice II/152 odpovídá kategorii S 7,5/60.

Při rekonstrukci silnice se vybudovaly také 2 autobusové zálivy v km 0,800-0,830 vpravo a km 0,795-0,825 vlevo, kompletně zrekonstruovaly 2 propustky v km 0,624 a 1,045, provedly nové hospodářské sjezdy v km 0,390 (oboustranný) a v km 1,165 (vpravo) a provedla náhradní výsadba zeleně.

Součástí stavby byla také úprava vybraného úseku objízdné trasy (objekt SO191).

Projektant sil.: Viapont, s.r.o.
IČ: 46995447


Zhotovitel: ALPINE Bau CZ s.r.o.
IČ: 45192286

Termín realizace: 10/2013 – 06/2014

Náklady stavby: 29 308 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EIB, EU

Mapa

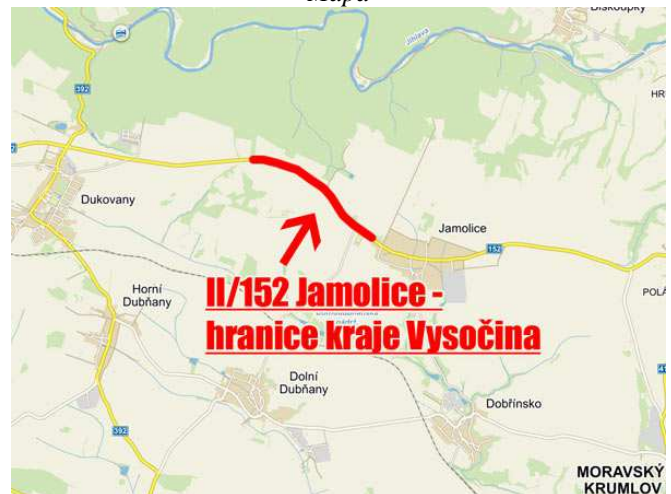

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

