

**Název stavby:**

**III/39810 Podhradí - Uherčice**

**Původní stav:**

Stavební a dopravně technický stav daného úseku stávající komunikace III/39810 byl celkově špatný a neodpovídal převáděnému dopravnímu zatížení. Povrch komunikace byl v havarijním stavu, vykazoval četné plošné deformace, výtluky a trhliny. Místy nefungovalo řádné odvodnění komunikace.

**Nový stav:**

Předmětem stavby bylo provedení úpravy silnice III/39810 v extravilánu v úseku od obce Podhradí nad Dyjí směrem na Uherčice v délce 1300m. Úprava provedena ve staničení km 12,813–14,113.

Úprava zahrnovala zesílení stávající komunikace, která se provedla vyčištěním komunikace, provedením vyrovnávky vrstvou ACL 16 a následným položením obrusné vrstvy z ACO 11 bez podélné pracovní spáry. Stávající šířkové poměry byly zachovány, došlo ke zřízení nezpevněné krajnice na obou stranách komunikace a k osazení směrových sloupků. Součástí prací byla i reprofilace příkopů a výměna stávajících propustků (došlo k obnově 7 propustků).

**Konstrukce úpravy:**

- asfaltový beton ACO 11 50/70 tl. 40mm
- spojovací postřik 0,2 kg/m<sup>2</sup>
- asfaltový beton ACL 16 50/70 tl. 20-70mm
- spojovací postřik 0,3 kg/m<sup>2</sup>

**Projektová dokumentace:**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.  
IČO: 42767377

**Zhotovitel:**

„Společnost Podhradí – Uherčice“

HABAU CZ s.r.o.

IČO 26068338

(vedoucí účastník sdružení)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.

IČO FN 198764a


(člen sdružení)

**Termín realizace:** 9/2014 až 11/2014

**Náklady stavby:** 7 062 tis. Kč

**Zdroj financování:** NIV SÚS JMK

Mapa

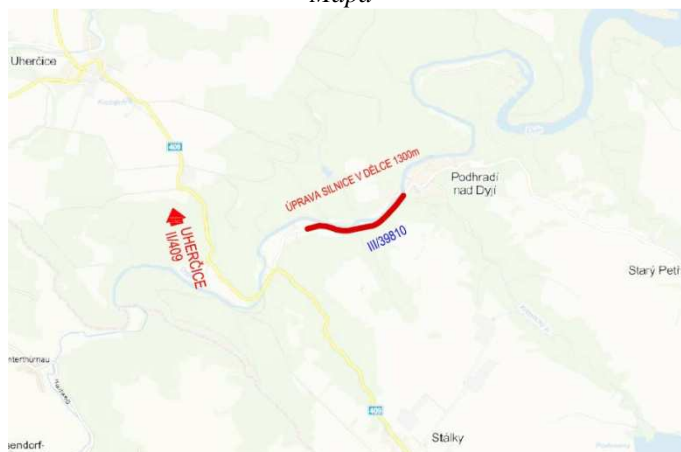

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

