

Název stavby:

**II/379 Drnovice – Vyškov
Mikrokoberec**

Stav před stavbou:

Povrch silnice II/379 v úseku Drnovice - Vyškov vykazoval značné množství poruch, narušujících celistvost krytu, proto bylo rozhodnuto provést jeho ošetření v rámci souvislé údržby vozovek položením dvouvrstvého mikrokoberce. Kanalizační poklopy ve vozovce byly uvolněné a pokleslé pod úroveň nivelety vozovky.

Nový stav:

V rámci souvislé údržby bylo provedeno ošetření povrchu vozovky položením emulzního mikrokoberce s obnovením protismykových vlastností.

V rámci přípravných prací bylo provedeno odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení, byly provedeny lokální vysprávkky porušeného povrchu (frézování tl. 30 mm, vyplnění asfaltovým betonem ACO do úrovně okolního povrchu), tenké mrazové trhliny byly opraveny profrézováním a zalitím asfaltovou zálivkou.

Na očistěný povrch byl položen mikrokoberec dvouvrstvý z modifikované emulze a kameniva frakce 4/8. Součástí akce bylo pozvednutí rámců kanalizačních poklopů do nivelety vozovky. Následně bylo provedeno zametení volného kameniva a bylo doplněno vodorovné dopravní značení.

Délka úseku: 2.227 m

Šířka vozovky: 7,5 m

Projektant: SÚS JMK


Zhotovitel: Společnost PDC + VIALIT -
MIKROKOBERCE 2016

Termín realizace: 08/2016 – 08/2016

Náklady stavby: 3 643 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa

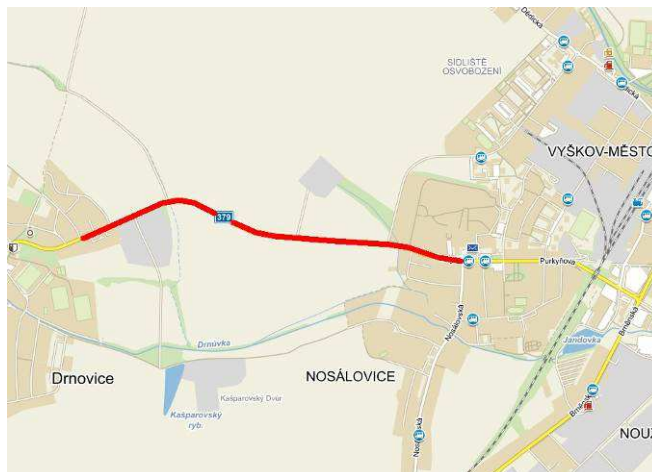

Stav před rekonstrukcí



Stav při rekonstrukci

