

Název stavby:

III/41621 Ivaň – křiž. I/52, Vranovice průtah

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávkky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o opravu dvou úseků silnice III/41621. První úsek v extravilánu mezi obcí Ivaň a křižovatkou se silnicí I/52 v délce 1,587 km. Druhý úsek byl v průtahu obcí Vranovice v délce 0,200 km. V rámci rekonstrukce bylo provedeno na stávajícím krytu vyrovnání vrstvou asfaltového betonu ACL MODIFIC. Následně byl proveden spojovací postřík a položena nová vrstva asfaltového betonu tř.I. v tl. 50 mm, ACO 11+.


Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Termín realizace: 9/2016 - 10/2016

Náklady stavby: 5 227 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

Mapa

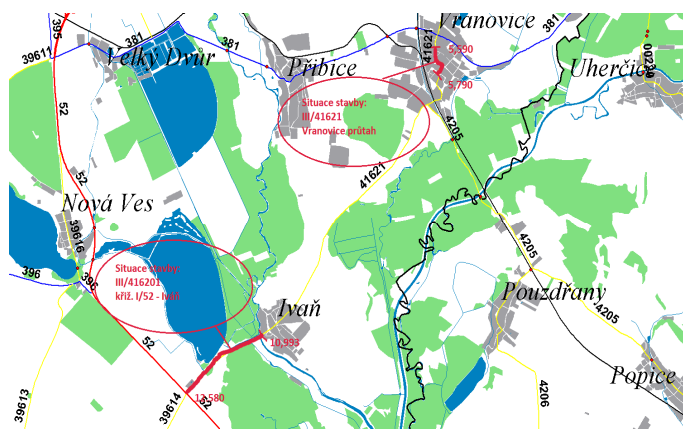

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

