


Mapa

Název stavby:

III/4199 Milešovice - Koberice

Stav před rekonstrukcí:

Řešený úsek silnice začíná v křižovatce se silnicí III/4165 za obcí Milešovice a končí v obci Koberice. Silnice má lehkou živičnou vozovkou šířky 5,0 m, vykazující značný rozsah poruch (trhliny, výtluky, deformace). S ohledem na špatný stavební stav a nedostatečnou únosnost vozovky bylo na základě diagnostiky rozhodnuto provést její zesílení novým asfaltobetonovým krytem. Délka úseku je 2,487 km.

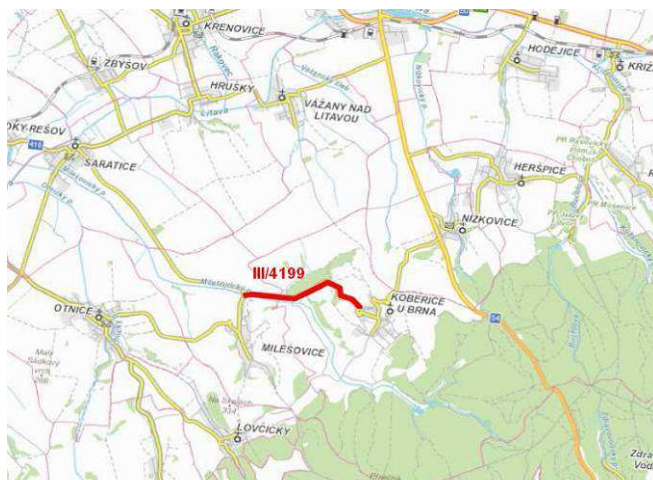

Stav před rekonstrukcí

Nový stav:

V extravilánu bylo provedeno vyrovnaní a zesílení vozovky položením nového asfaltobetonového krytu, dosypání a zhutnění krajnic a pročištění příkop. V intravilánu obce Koberice byla provedena obnova obrusné vrstvy při zachování stávající nivelety vozovky, stávající silniční obruba nebyla stavbou dotčena.

Délka úpravy 2.487 m, šířka vozovky 5,0 m.

Nové vrstvy vozovky:

ACO 11+	50 mm
spoj. postřik	0,2 kg/m ²
vyr. ACL 16+	120 kg/m ²
spoj. postřik	0,6 kg/m ²



Stav po rekonstrukci

Projektant: Viadesigne, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace: 10/2016 - 11/2016

Náklady stavby: 10 397 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC A MOSTŮ

