

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/37913 Drásov- Všechnovice - Unín

Stav před opravou:

Stávající komunikace III/37913 mezi obcemi Drásov, Všechnovice a Unín má převážně asfaltový kryt, případně kryt z penetračního makadamu opatřený nátěrem. Stav vozovky je porušen hloubkovou korozí, výtluky, příčnými, podélnými, mozaikovými i síťovými trhlinami. Na vozovce jsou patrné plošné deformace, nepravidelné hrboly jako důsledek prováděných vysrávek. Dále jsou zde zvýšené nebezpečné krajnice, zanesené příkopy i odvodňovací propustky. Na základě provedené diagnostiky byla vozovka zařazena do kvalifikačního stupně 5.

Nový stav:

Předmětem stavby byla souvislá údržba silnice III/37913, která byla rozdělena do dvou úseků. Začátek 1. úseku byl v obci Drásov za mostem ev.č. 37913-4 v km 2,750 a konec 1. úseku byl dán rozhraním asfaltových vrstev před obcí Všechnovice v km 5,000. Začátek druhého úseku byl za obcí Všechnovice v km 5,830 a konec 2. úseku byl před obcí Unín v km 8,130. Celková délka stavby byla 4,55 km. Oprava vozovky byla provedena následujícími technologiemi: frézování vozovky, sanace poruch po odfrézování a sanace okrajů vozovky, následně provedená recyklace za studena a položení nových asfaltových vrstev. Součástí zakázky byly nebezpečné krajnice, napojení stavby na stávající stav, reprofilace příkopů a obnova odvodňovacích prvků. Dále bylo součástí stavby vodorovné a svislé dopravní značení a také zajištění DIO.

Projektant: Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.


Zhotovitel: Drásov – EUROVIA + PORR

Termín realizace: 7/2025 - 11/2025

Náklady stavby: 73 757 tis. Kč s DPH

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC, SFDI NIV.

Mapa

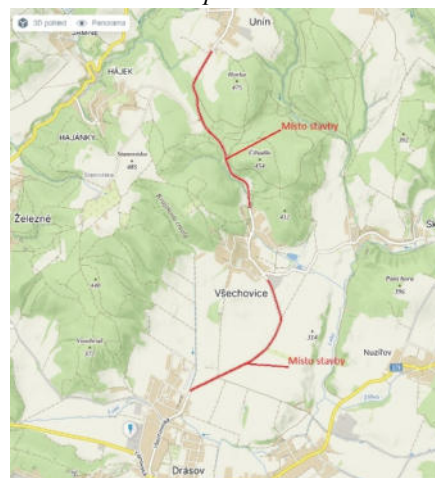

Stav před opravou



Stav po opravě

