

*Název stavby:*

## **III/4254 Mutěnice - Dubňany**

*Stav před rekonstrukcí:*

Důvodem rekonstrukce byla havarijní únosnost, celoplošný výskyt konstrukčních poruch a nedostatečná tloušťka asfaltových vrstev. Povrch vozovky vykazoval značné plošné deformace a poruchy způsobené nárůstem dopravy zejména v krajích vozovky, včetně nedostatečného odvodnění povrchu komunikace.

*Nový stav:*

Rekonstrukce silnice III/4254 v extravilánovém úseku mezi obcemi Mutěnice a Dubňany a v úseku části intravilánu obce Dubňany, kde má extravilánový charakter. V km 0,000 - 2,465 byla provedena recyklace za studena a položení ložné a obrusné vrstvy vozovky, na zbývajícím úseku proběhlo frézování, sanace trhlin a položení ložné a obrusné vrstvy vozovky. Dále se provedlo pročištění příkopů, sanace propustku, úprava sjezdů. Bylo zřízeno nové svislé a vodorovné značení.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,812 km.

**Projektant:** Laboro ateliér s.r.o.


**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Termín realizace:** 7/2018 - 10/2018

**Náklady stavby:** 26 966 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, SFDI

*Mapa*

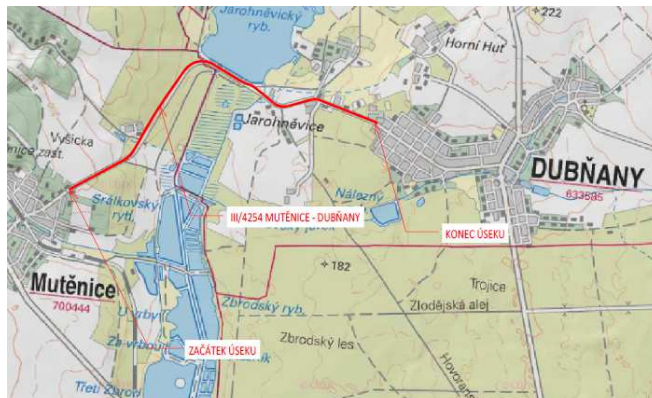

*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

