

Název stavby:
II/390 Nedvědice – Sejřek

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný stavební stav krytu vozovky. Na tomto úseku komunikace byly výrazně poškozeny obrusné vrstvy po dlouhodobém opotřebení.

Nový stav:

Jednálo se o provedení opravy krytové vrstvy silnice II/390 v úseku mezi městysem Nedvědice a obcí Sejřek ve staničení km 0,690 – 2,340 v celkové délce 1 650 m. Oprava zahrnovala obnovení poškozené obrusné vrstvy, se zafrézováním tl. 5 cm na začátku a konci úseku, pokládkou nové asfaltové vrstvy tl. 5 cm s vyrovnáním příčného sklonu komunikace.


Konstrukce opravy:

- plošné vyrovnání nerovností z ACO (AB);
- spojovací postřik 0,7 kg/m²;
- obrusná vrstva z ACO 11 (ABS), tl.50 mm.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Praha
IČ: 26177005

Termín realizace: 11/2013
Náklady stavby: 3 399 tis. Kč včetně DPH
Zdroj financování: SFDI
ISPROFIN: 56211200

Mapa

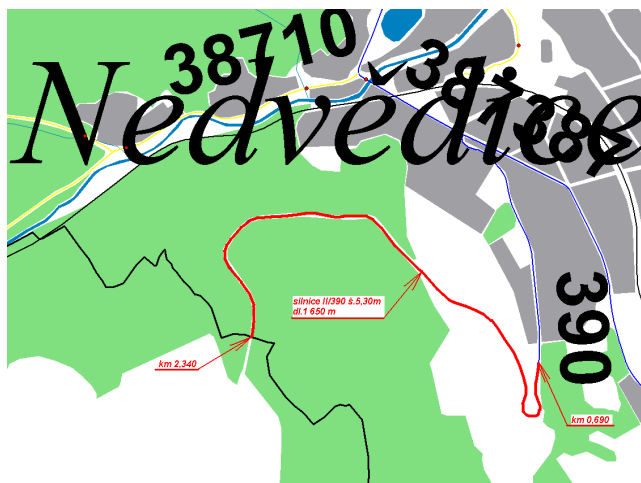

Stav před opravou



Stav po opravě

