

Název stavby:

III/3935

Nová Ves - Senorady

Původní stav:

Důvodem opravy předmětného úseku byl celkově špatný stavební stav krytu vozovky. Na tomto úseku komunikace byly výrazně poškozeny obrusné vrstvy po dlouhodobém opotřebení.

Nový stav:

Jednalo se o provedení opravy silnice III/3935 v úseku km 4,180-5,630 v délce 1 450m. Součástí byla i oprava povrchu křižovatky se silnicí III/3936 v rozsahu 200m². Oprava zahrnovala obnovení poškozené obrusné vrstvy, se zafrézováním tl. 5cm na začátku a konci úseku, dále napojení za křižovatkou se silnicí III/3936 a pokládkou nové obrusné vrstvy z asfaltového betonu tl. 5 cm s vyrovnáním příčného sklonu komunikace.

Konstrukce opravy:

- plošné vyrovnání nerovností z ACO (AB);
- spojovací postřik 0,7 kg/m²;
- obrusná vrstva z ACO 11 (ABS), tl.50 mm.

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno,
spol. s r.o.
IČ: 41601645


Termín realizace: 11/2013

Náklady stavby: 3 509 tis. Kč včetně DPH

Zdroj financování: SFDI

ISPROFIN: 5621120002

Mapa

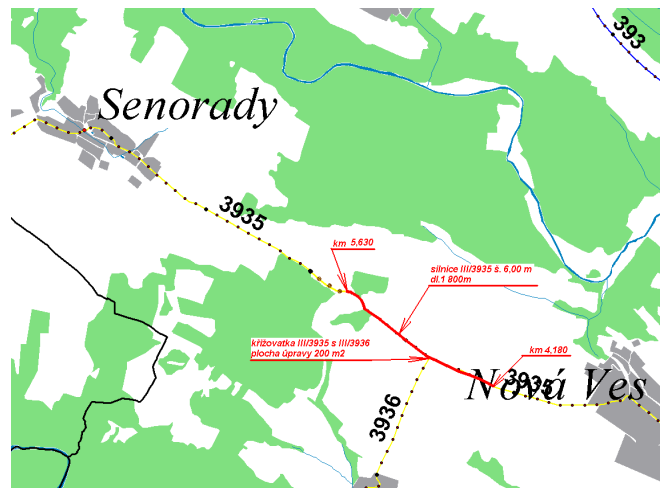

Stav před opravou



Stav po opravě

