

Název stavby:

III/41911 Kobeřice – po výstavbě kanalizace

Stav před rekonstrukcí:

Silnice III/41911 v obci Kobeřice s lehkou živičnou vozovkou šířky 5,0 m byla značně narušena uložením kanalizačního řadu a přípojek do vozovky. S ohledem na stavební stav a plně vyčerpanou životnost vozovky bylo rozhodnuto provést její komplexní rekonstrukci, a to jako společnou investici JMK a Obce Kobeřice. Pasportní délka silnice je 0,320 km, dále pokračuje jako místní komunikace.

Nový stav:

Původní porušené konstrukční vrstvy vozovky byly odstraněny včetně původních obrub. Na upravenou pláň a rozprostřené podkladní vrstvy byly osazeny nové betonové obruby a položeny nové vozovkové vrstvy z asfaltbetonu. Následně byly provedeny terénní úpravy za obrubami.

Délka úpravy 320 m, šířka vozovky 6,0 m mezi zvýšenými obrubami.

Nová konstrukce vozovky:

ACO 11+	50 mm
spoj. postřik	0,25 kg/m ²
ACP 16+	50 mm
inf. postřik	1,3 kg/m ²
SC	120 mm
ŠD	200 mm

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Termín realizace: 04/2016 - 07/2016


Náklady stavby: 4 710 Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí

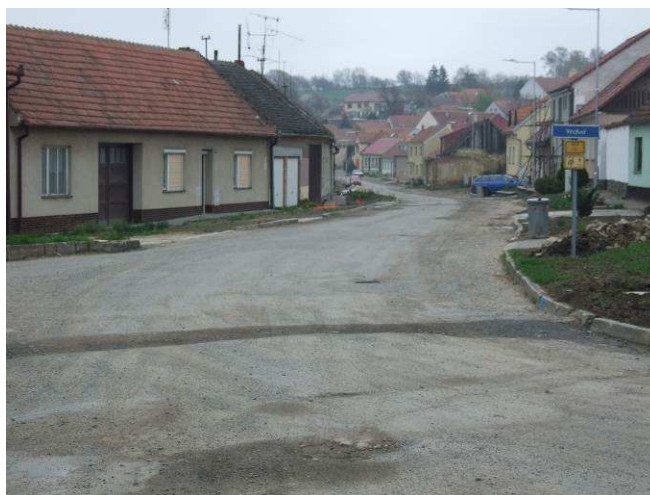

Stav po rekonstrukci

