jihomoravský kraj

REFERENČNÍ LIST STAVBY

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Název stavby:

II/379 Lažánky - Rudice

Stav před rekonstrukcí:
Povrch silnice II/379 v extravilánovém úseku od křižovatky se sil. III/37921 do obce Vilémovice ve směru na městys Jedovnice byl narušen korozí, vykazoval ztrátu pojiva v obrusné vrstvě a byly zaznamenány mělké výtluky. Povrch byl rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace většího rozsahu ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností.

Nový stav:
Opravovaný úsek se nachází v km 45,550 – 46,425 provozního staničení silnice II/379. Na tomto úseku bylo v celé ploše provedeno frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 40 mm v celkovém objemu 226,400 m^3. Asfaltový recyklát byl odvážen a uskladněn na skládce SÚS JMK Jedovnice k dalšímu využití. Po provedení spojovacího postřiku byla položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 50/70 v tl. 50 mm v celkové ploše 5.660 m^2.
Po dokončení pokládky obrusné vrstvy bylo provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodicí čáry V4 š. 12,5 cm a střední dělicí čára š. 12,5 cm. Celková plocha provedeného VDZ činí 328 m^2.
Stavební práce byly prováděny za částečné uzavírky silnice II/379 po polovinách, provoz byl řízen světelnou signalizací.

Silnice II/379 Lažánky - Rudice

Staničení	km 45,550 – 46,425
Délka úseku:	0,875 km

Projektant:	SÚS JMK
Zhotovitel:	**OHL ŽS a.s.**
Termín realizace:	11/2019 – 12/2019
Náklady stavby:	2 202 tis. Kč
Zdroj financování:	REZERVA SÚS JMK 2019

Mapa

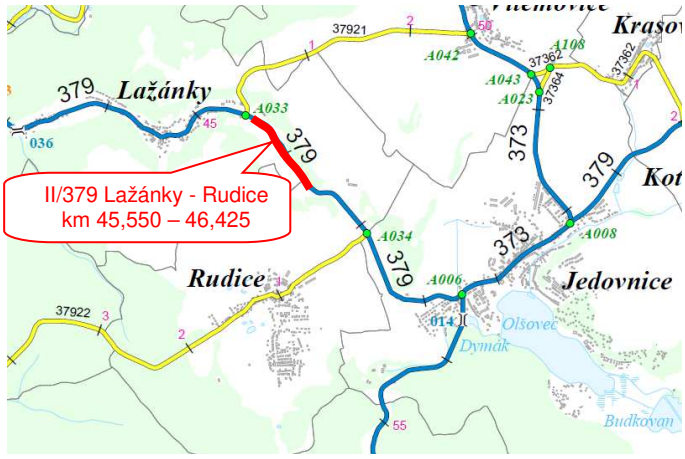

Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci
