REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

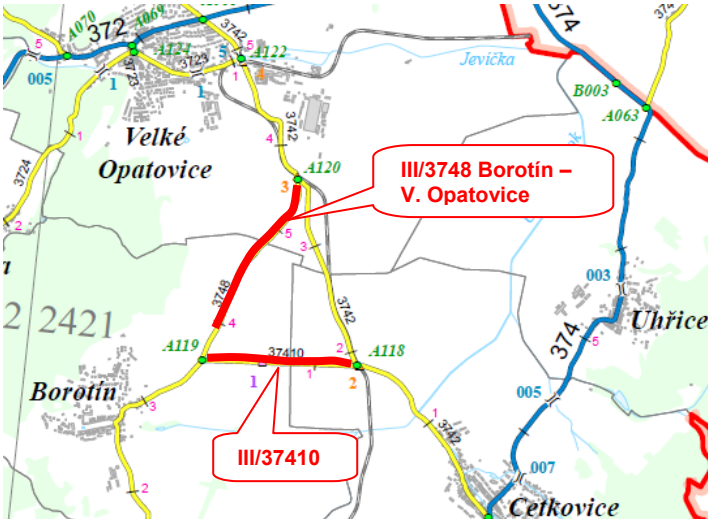

Název stavby:

III/3748 Borotín – Velké Opatovice

Stav před rekonstrukcí:

Stávající konstrukce vozovky silnice III/3748 v úseku Borotín – Velké Opatovice má nejednotný povrch (AB a penetrační makadam) vykazující nerovnosti vlivem provádění četných vysprávek v různých časových obdobích. Na vozovku navazují nezpevněné krajnice. Odvodnění povrchové přes silniční příkopu a propustky.

Nový stav:

Stavba řeší úpravu krytu silnice III/3748 v extravilánu mezi obcí Borotín a žel. přejezdem před V. Opatovicemi. Na stávající povrch byla provedena vyrovnávací vrstva v prům. tl. 2 cm a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm. Byla provedena obnova (dosypání) nezpevněných krajnic. V rámci stavby byla provedena i oprava obrusné vrstvy na silnici III/37410, která byla využita jako objízdná trasa při opravě silnice III/3748.

<u>Silnice III/3748</u>
Staničení 3,908 – 5,500 km
Délka úseku: 1,592 km
Šířkové uspořádání proměnné, odpovídající stávajícím šířkovým poměrům .

<u>Silnice III/37410</u>
Staničení 0,000 – 1,378 km
Délka úseku: 1,378 km
Šířkové uspořádání proměnné, odpovídající stávajícím šířkovým poměrům .

Celková délka opravených úseků : 2,970 km

Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci

Projektant:	-
Zhotovitel:	PSVS a.s., Provozní jednotka Brno
Termín realizace:	06/2011
Náklady stavby:	4 806 tis. Kč
Zdroj financování:	ŠKODY PO ZIMĚ Z IF SÚS JMK
